Lemaire Alexis
Danlos Ludovic
Finalteri Thomas
Salah Boudjémâa
Chedozeau Mathieu

# Gestion des risques:

#### Etape 1:

| risque 1 | : s  | uppres | ssion | du   | gi | t   |
|----------|------|--------|-------|------|----|-----|
| risque 2 | 2: p | roblèn | ne av | ec l | le | rpi |

risque 3: coupure de courant

risque 4: absence de membre du groupe

risque 5: bug dans le code

risque 6: mauvaise organisation dans la répartition des tâches

risque 7: le serveur ne répond pas au moment de son utilisation

risque 8: demande de changements de la part du client en cours du projet

risque 9: potentiel mauvaise installation des pages web

risque 10: potentiel tentative de hack du serveur

risque 11: prise en compte du rgpd

risque 12: risque de suppression de fichier par maladresse

risque 13: vol possible du rpi 4

risque 14: manque de temps

risque 15: demande de tâche supplémentaire non demandé

risque 16: dépendance aux ressources


risque 17: mauvaise estimation des délais

risque 18: reconfinement

risque 19: changement de priorités dans l'organisation

risque 20: changement des objectifs du projet

### Schéma d'Ishikawa

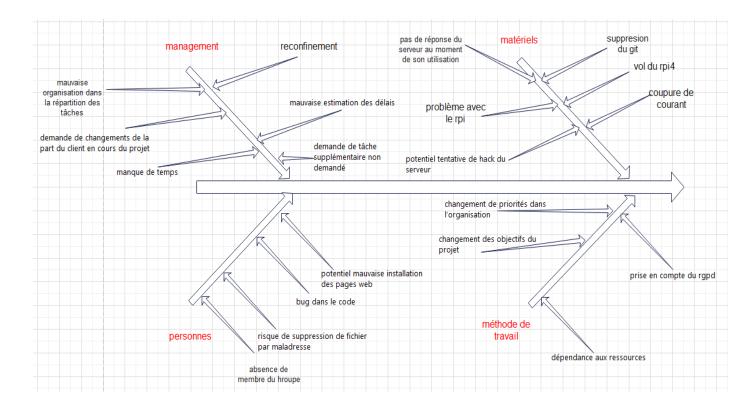

## Etape 2:

|         | improbable | vraisemblable | probable |
|---------|------------|---------------|----------|
| Elevée  | 9,12,13,20 | 1,2,7         |          |
| modérée | 18         | 3,6,14,17     | 5,8,15   |
| faible  |            | 19,20         | 4,11,16  |

### Etape 3:

risque 1: évitement

risque 2: atténuation

risque 3: élaboration d'une réponse conditionnelle

risque 4: acceptation passive

risque 5: évitement

risque 6: acceptation active risque 7: acceptation passive risque 8: acceptation active

risque 9: évitement risque 10: atténuation

risque 11: acceptation active

risque 12: évitement

risque 13: transfert vers un tiers

risque 14: atténuation

risque 15: acceptation active risque 16: acceptation passive

risque 17: évitement

risque 18: élaboration d'une réponse conditionnelle

risque 19: acceptation active risque 20: acceptation active

# Etape 4:

| num | date<br>identifi<br>cation | risque   | facteur de risque  | action  | pilote | etat        |
|-----|----------------------------|--|--|---|--------|-------------|
| 1   | 07/12                      | suppression<br>du git  | perte de tous nos<br>fichiers regroupés                              | avoir chacun la<br>dernière<br>version du<br>projet dans nos<br>propres fichiers        | tous   | en<br>cours |
| 2   | 07/12                      | problème<br>avec le RPI<br>4                                     | dysfonctionnement du<br>serveur et perte des<br>données mis dessus   | regarder l'état<br>du serveur<br>fréquemment  | tous   | en<br>cours |
| 3   | 07/12                      | coupure de<br>courant  | impossibilité de<br>travailler sans<br>électricité                   | prévoir de<br>travailler chez<br>soi en cas de<br>coupure de<br>courant à l'iut         | tous   |             |
| 4   | 07/12                      | absence<br>d'un<br>membre du<br>groupe                           | indisponibilité qui<br>pourrait entraîner le<br>retard sur le projet | répartition<br>différente des<br>tâches et<br>rattrapage du<br>travail pour<br>l'absent | tous   | en<br>cours |
| 5   | 07/12                      | bug dans le<br>code  | prise de retard dans le<br>projet                                    | utiliser des<br>débogueur pour<br>éviter des<br>erreurs,faire<br>des tests              | tous   | en<br>cours |
| 6   | 07/12                      | mauvaise<br>organisation<br>dans la<br>répartition<br>des tâches | prise de retard<br>probable et<br>conséquente                        | analyser et<br>répartir les<br>tâches d'une<br>autre manière                            | tous   | en<br>cours |
| 7   | 07/12                      | pas de<br>réponse du<br>serveur                                  | impossibilité d'avancer<br>dans le projet                            | essayer de<br>réparer le<br>serveur dans<br>les plus bref<br>délais                     | tous   |             |
| 8   | 07/12                      | demande de<br>changement<br>dans le<br>projet                    | risque de retard et de<br>complexification du<br>projet              | mise en place<br>d'une stratégie<br>en fonction des<br>demandes du<br>client            | tous   | en<br>cours |

| 9  | 07/12 | potentiel<br>mauvaise<br>installation<br>des pages<br>web   | risque de bug et<br>problèmes à<br>l'ouverture du site  | tester<br>régulièrement<br>le site après<br>avoir changer<br>les pages  | tous              | en<br>cours |
|----|-------|---|---|---|-------------------|-------------|
| 10 | 07/12 | potentiel<br>tentative de<br>hack                           | risque de vol et de<br>perte de code et de<br>page sur le serveur   | mise en place<br>de sécurité<br>supplémentaire<br>en créant des<br>mdp complexe   | tous              | fini        |
| 11 | 07/12 | prise en<br>compte du<br>RGPD                               | demande de<br>changement de la part<br>de la CNIL et<br>entraînement de<br>retard sur le projet                       | lecture des<br>exigences de la<br>CNIL et<br>développement<br>en fonction de<br>leur exigence   | tous              | en<br>cours |
| 12 | 07/12 | risque de<br>suppression<br>de fichier<br>par<br>maladresse | risque de perte de<br>fichier important et de<br>recommencer une<br>partie du projet ce qui<br>entraînerait du retard | sauvegarde à plusieurs endroit et partage des fichiers aux autres membres du projet   | tous              | en<br>cours |
| 13 | 07/12 | vol possible<br>du RPI 4                                    | risque d'abandon du<br>projet ou de<br>recommencement<br>depuis le début  | demander la<br>sécurisation du<br>serveur par le<br>client  | chef de<br>projet | en<br>cours |
| 14 | 07/12 | manque de<br>temps  | risque de prise de<br>retard  | répartition des<br>tâches en<br>fonction des<br>compétences<br>pour éviter un<br>retard, faire une<br>estimation des<br>tâches à<br>réaliser le plus<br>précis et correct<br>possible | chef de<br>projet | en<br>cours |
| 15 | 07/12 | demande de<br>tâche<br>supplément<br>aire non<br>demandé    | risque de retard et<br>demande en dehors<br>des compétences de<br>base  | prise de décision<br>pour voir la<br>meilleur<br>répartition des<br>tâches et la<br>meilleure solution<br>tout en rentrant<br>dans les délais et<br>les coûts                         | chef de<br>projet | en<br>cours |

| 16 | 07/12 | dépendance<br>aux<br>ressources                         | risque de problème si<br>les ressources ne sont<br>pas correctes                                | regarder la<br>validité des<br>ressources<br>fournis   | tous | en<br>cours |
|----|-------|---|---|--|------|-------------|
| 17 | 07/12 | mauvaise<br>estimation<br>des délais                    | risque de retard<br>pouvant compromettre<br>le rendu dans les<br>temps du projet                | fournir un<br>planning avec<br>des prévisions<br>plus large que<br>ce qu'il était<br>prévu   | tous | en<br>cours |
| 18 | 07/12 | confinement   | risque de problèmes<br>de gestion et de retard  | prévoir de<br>travailler chez<br>soi en cas de<br>confinement et<br>trouver une<br>organisation<br>rapidement                          | tous | en<br>cours |
| 19 | 07/12 | changement<br>de priorité<br>dans<br>l'organisatio<br>n | risque de retard dans<br>le planning  | travailler sur la<br>tâche prioritaire<br>puis reprendre<br>le travail où on<br>l'avait arrêt,<br>revoir et<br>modifier le<br>planning | tous | en<br>cours |
| 20 | 07/12 | changement<br>des objectif<br>du projet                 | risque de retard dans<br>le planning, risque de<br>manque de<br>compétence pour les<br>demandes | regarder les<br>compétences<br>requises et<br>revoir le<br>planning  |      |             |
